



KOKUDO

MOVE EARTH, MOVE EVERYTHING
日本国土開発株式会社

国道4号工事状況のお知らせ

～地下歩道工事状況～

安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

●国道4号の増田地内において、道路改良工事(地下歩道工事)を夜間車道部の車線減少規制通行にて行っています。
8月8日(日)～8月15日(日)までは夏季休暇で休工となります。ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力をお願いします。

7月の作業状況について

横断部鋼矢板の引抜き作業を行いました。



鋼矢板の引抜き状況です。



鋼矢板引抜き完了

鋼矢板引抜き完了です。鋼矢板は横断部の一部を引抜きました。東西の階段部の施工のために、一部の鋼矢板はまだ残っています。



鋼矢板引抜き

鋼矢板引抜きと同時に、地面に特殊な材料を充填します。



特殊材料

鋼矢板を引抜くと地面の中に小さな隙間が出来ます。その隙間に特殊材料を充填することで、地表の沈下や陥没を防ぎ、車道路面の安全を確保します。特殊な材料が地表にあふれてきて、十分に充填がされていることが確認できます。



東側の横断管渠φ1000の施工を行いました。



規制範囲

工事場所

増田小学校

名取市役所

名取北高等学校


増田中学校

規制場所	宮城県名取市増田地内
規制内容	夜間 車線減少(上り2車線⇒1車線、下り2車線⇒1車線)
規制時間	21時00分 から 翌6時00分 まで (昼は車道規制行いません)

- 全体工事期間 令和元年9月30日 至令和3年9月30日
- 全体工事内容 地下歩道構築工事、排水構造物工事、仮設工事
※地下歩道内装工事、電気工事は次期工事になります。

8月の作業予定

横断部施工完了箇所中央部の舗装打ち替え作業の残りを行います。(本舗装復旧作業)
西側(ゆず庵さん側)の仮設鋼矢板圧入の準備作業として、支障物撤去などを行います。

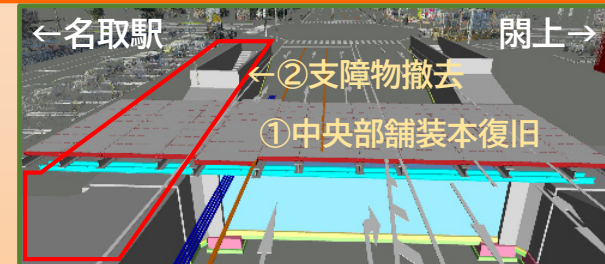

←名取駅

閉上→

②支障物撤去

①中央部舗装本復旧



シンボルキャラクターのコクドくんです。コクドくんは、工事現場での隠れた危険の芽をついばみ、また地域の皆様とのコミュニケーションをはかります。

【発注者】:国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 交通対策課 TEL022-248-0061
【工事監督】:国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼国道維持出張所 TEL0223-22-3039
【施工者】:日本国土開発株式会社 東北支店 増田改良作業所 TEL022-302-7452 作業所長 菅野友壽

国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	7月31日 土	有	21:00~6:00	横断部舗装復旧
	8月1日 日	無	—	休工
来週	8月2日 月	無	8:00~17:00	東側歩道部 舗装復旧
	8月2日 月	有	21:00~6:00	横断部舗装復旧
	8月3日 火	無	8:00~17:00	東西管路管口処理
	8月3日 火	有	21:00~6:00	横断部舗装復旧
	8月4日 水	無	8:00~17:00	既設横断管閉塞作業（東西作業）
	8月4日 水	有	21:00~6:00	横断部舗装復旧
	8月5日 木	無	8:00~17:00	既設横断管閉塞作業（東西作業）
	8月5日 木	有	21:00~6:00	横断部舗装復旧
	8月6日 金	有	21:00~6:00	横断部舗装復旧
	8月7日 土	無	21:00~6:00	夏季休暇対策
	8月8日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■: 夜間作業 ■: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

車道路面の覆工板は撤去となりましたが、舗装復旧による継目により大型車両の通行時などで、通常より大きな走行音が発生することもあります。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

8月8日(日)から8月15日(日)までは、夏季休暇となり作業は休工といたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年7月30日

【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

8月8日(日)から8月15日(日)までは、夏季休暇となり作業は休工といたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	8月7日 土	無	21:00~6:00	夏季休暇前 現場一斉点検
	8月8日 日	無	—	休工
再来週	8月16日 月	有	21:00~6:00	横断部舗装復旧
	8月17日 火	有	21:00~6:00	横断部舗装復旧
	8月18日 水	有	21:00~6:00	横断部舗装復旧
	8月19日 木	有	21:00~6:00	車道部 仮区画線作業
	8月20日 金	有	21:00~6:00	車道部 仮区画線作業
	8月21日 土	無	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入準備
	8月22日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■：夜間作業 ■：昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

舗装復旧による継目により大型車両の通行時などで、通常より大きな走行音が発生することもあります。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年8月5日

【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	8月21日 土	有	21:00~6:00	車道部 仮区画線作業
	8月22日 日	無	—	休工
来週	8月23日 月	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	8月24日 火	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	8月25日 水	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	8月26日 木	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	8月27日 金	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	8月28日 土	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	8月29日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■: 夜間作業 ■: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

舗装復旧による継目により大型車両の通行時などで、通常より大きな走行音が発生することもあります。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年8月20日

【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	8月28日 土	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	8月29日 日	無	—	休工
来週	8月30日 月	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	8月31日 火	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	9月1日 水	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	9月2日 木	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	9月3日 金	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	9月4日 土	有	21:00~6:00	西側支障物撤去（ゆず庵さん側）
	9月5日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■: 夜間作業 ■: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

舗装復旧による継目により大型車両の通行時などで、通常より大きな走行音が発生することもあります。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年8月27日

【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽

