

(様式第 16 号)

平成 25 年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名 : 名取市

市役所庁舎事務室環境配慮型照明更新事業

<事業目的>

庁舎建設から 37 年が経過し、照明器具の老朽化により照明効率が低下している。

従来の蛍光灯を、高効率反射板を使用した環境配慮型照明設備へ更新することにより、庁舎の使用電力量を削減し、CO2 排出抑制を図る。

二酸化炭素の削減効果	kg-co2
	14,531
その他	

<事業内容>

40W×2 灯タイプを、高効率反射板 32W×1 灯タイプに更新。

当年度の事業費 (計画) 4,100,000 円

(実績) 4,077,150 円

事業量 (計画) 275 基

(実績) 276 基

事業実施期間

(計画)


平成 25 年 10 月 1 日～平成 25 年 12 月 28 日

(実績)

平成 25 年 8 月 16 日～平成 25 年 12 月 10 日

補助額 (率) (計画・実績) 4,000,000 円 (10/10)

(表示板)

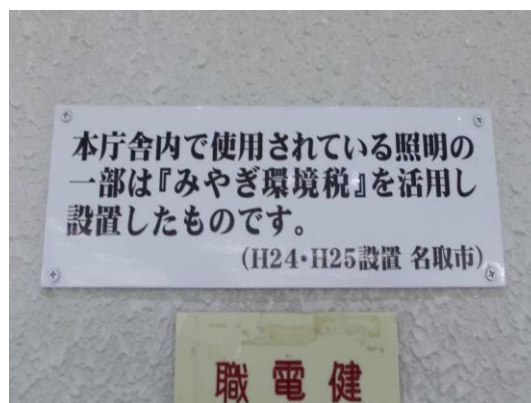

(施工前)



(施工後)



<その他>

平成25年度 みやぎ環境交付金事業 (計画・実績) 概要書

市町村名 : 名取市

街路灯環境配慮型照明更新事業

<事業目的>

道路照明を水銀灯から高圧ナトリウム灯に更新することにより、消費電力の削減及び二酸化炭素排出量の削減を図る。有害な水銀の使用を抑制する。

二酸化炭素の削減効果	31,992kg-co2
その他	

<事業内容>

市道高架街路灯について、水銀灯 400w (415w) を高圧ナトリウム灯 180w (200w) へ変更する。

当年度の事業費 (計画) 3,697,000 円
(実績) 3,655,050 円

事業量 (計画・実績) 62基

事業実施予定期間

(計画) 平成25年9月 1日～平成25年12月 28日

(実績) 平成25年6月 3日～平成25年12月 19日

補助額 (率) 3,597,000円
(10/10)

<その他>

5箇年で下記のスケジュールにて整備予定

平成23年度 69基 (実績)
平成24年度 71基 (実績)
平成25年度 62基 (実績)
平成26年度 41基 (計画)
平成27年度 31基 (計画)
計 274基

